

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
2014 година**

I. Обща информация. Административно обслужване


Административното обслужване на Програмата включваше анализ на състоянието на спортната инфраструктура, въз основа на подадени от кметове на районни администрации информации, съгласуване включването на училищната спортна инфраструктура с дирекция „Образование“, както и експертно обсъждане с ПК за ДМСТ към СОС.

- Доклад до СОС № СО-9300-8/5/13.02.2014г. – предложение с обекти за включване в Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2014 година;
- С Решение № 95/20.02.2014г. на СОС е утвърдена Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2014 година в размер на 120 000 лева, включваща ремонтни дейности на 4 училищни физкултурни салона, 3 спортни площадки и 2 плувни басейна;
- Въз основа на писмо № СО-0805-163/25.07.2013г. от РА „Сердика, писмо № СО-0821-301/01.09.2014г. от РА „Нови Искър“ и протокол от мониторинг на площадка в район „Триадица“, са планирани спешни ремонтни и обезопасителни дейности на 3 общински спортни площадки – докладни записки № СО-6600-3088/1/05.09.2014г и № СО-0821-201/4/29.09.2014г.
- Средствата в размер на 12 000 лв. са за сметка на планирани дейности от Годишен календарен план на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“;
- В писма № СО-0800-72/20/12.09.2014г. от РА Средец, № СО-0821-324/10.09.2014г. от РА „Нови Искър“, № СО-0800-72/14/29.07.2014г. от РА „Лозенец“ и протокол от мониторинг на площадка, са представени справки за състоянието на общинска и училищна спортна база, както и искания от кметове на районни администрации за ремонтни дейности.
- С доклад до СОС № СО-6200-1067/2/25.09.2014г. е предложено завишаване на бюджета на Програма за ремонт на спортна инфраструктура с 34 022 лв., представляващи неусвоени средства от Програма за изпълнение на Общинската Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /сесия обявена с Решение № 414/26.06.2014г./;
- С Решение № 623/09.10.2014г. на СОС е завишен бюджета на Програмата за ремонт за 2014г. и са включени 4 нови обекта за ремонт;
- Общо средства по Програмата 166 022 лева за 2014г.;
- Усвоени - 165 692,76 лева; Остатък – 329,24 лева;
- Финансирани са 16 спортни обекта – 6 училищни физкултурни салона, 2 плувни басейна, 8 междублокови спортни площадки.

II. Статистика

- 6 физкультурни салона - 80 022 лв.
- 2 училищни басейна - 50 000 лв.
- междублокови сп. площадки - 36 000 лв.

Обща стойност: 166 022 лева



III. Описание на извършените дейности

Училищни басейни

Районна единица	Училище	Вх. №/ представител дата/месец	Извършените ремонтни дейности	Преведени Усвоени средства
Район Искър	150 ОУ „Цар Симеон Първи” 382 ученика/ 18 паралелки	СО-9300-8/31/ 09.12.14г. доклад-отчет ✓ фактури ✓ приемо- предавателен протокол ✓ договор с фирмата изпълнител ✓ СМР снимков материал	Демонтаж на съществуваща дограма: подмяна на метална дограма с ПВЦ в басейн, съблекални и стаи на треньори.	Отпуснати целево 20 000 лв. Усвоени 19 920 лв.
Район Люлин	97 СОУ „Братя Миладинови” 784 ученика/ 37 паралелки	СО-0819- 390/16.12.14г. ✓ доклад-отчет ✓ фактури ✓ договор с фирма изпълнител ✓ договор с фирма за авторски надзор и техническа помощ ✓ договор с фирма за строителен надзор и инвеститорски контрол ✓ протокол обр. 19 ✓ констативен акт за установяване годността за	Ремонтно възстановителни работи, предвидени в доклада за оценка на състоянието на сградата, на 97 СОУ, р-н Люлин от 2012г. – етапно изпълнение, в УПИ II – за училище, кв.14.м. Люлин- 5 м.р., по плана на гр. София – Трети етап * Към момента няма фактура за окончателно плащане по договор за басейна при 97 СОУ, поради факта, че строежа не е въведен в експлоатация, по изискванията на ЗУТ	Отпуснати целево 30 000 лв. Усвоени 71 728,58 лв. /*останалите средства в размер на 41 728,58 лв.са допълнително осигурени от дирекция „Образование” и от резервен бюджетен кредит от СО,

	приемане на строежа и снимков материал	Заповед № 798/
--	---	-------------------

Училищни физкултурни салони

Районна администрация	Училище (бр.ученици/паралелки)	Вх. № / представени документи	Извършени ремонтни дейности	Преведени /Усвоени средства
Район Враждане	30 СОУ „Братя Миладинови“ 800 ученика / 36 паралелки	СО-9300-8/29/13.10.2014 г. доклад-отчет ✓ копие от протокол за установяването и заплащането ✓ фактури ✓ приемо-предавателен протокол ✓ договор с фирмата изпълнител ✓ снимков материал	Демонтаж на съществуваща дограма; подмяна на метална дограма с ПВЦ по фасадата и входовете – четири камерна с к-стъкло; обръщане около дограма; изнасяне и извозване на строителни отпадъци до 25 км; доставка и монтаж на оградна мрежа 1,2 мм x 1,2 мм в цвят	Отпуснати целево 20 000 лв. Усвоени 19 956 лв.
Район Подуяне	130 СОУ „Стефан Караджа“ 500 ученика / 21 паралелки	СО-9300-8/30/15.10.2014 г. доклад-отчет ✓ фактури ✓ приемо-предавателен протокол ✓ ценово предложение от фирмата – изпълнител; ✓ договор с фирмата изпълнител ✓ Акт 19 от фирмата – изпълнител ✓ снимков материал	Ремонт на: - физкултурен салон: доставка и монтаж на готови олущи от поцинкована ламарина; ремонт на водосточни казанчета; стъргане, шпакловка, грундиране и трикратно боядисване на стени и тавани; уплътняване на дограма между зида и касите; подмяна на дървени врати с алуминиеви; циклене и лакиране на дюшеме; пренос на строителни отпадъци - съблекални: стъргане, шпакловка, грундиране и трикратно боядисване на стени и тавани - коридор: стъргане, шпакловка, грундиране и трикратно боядисване на стени и тавани; доставка и монтаж на осев вентилатор	Отпуснати целево 14 000 лв. Усвоени 13 993,38 лв.
Район Младост	10 СОУ „Геодор Траянов“ 383 ученика / 24 паралелки	СО-9300-8/21/20.08.2014 г. ✓ доклад-отчет ✓ фактури ✓ приемо-предавателен	Ремонт на физкултурен салон: демонтаж и монтаж на метална конструкция и мека предпазна мрежа на прозорците; изработка и монтаж на предпазен парпет; доставка и монтаж на	Отпуснати целево 11 000 лв. Усвоени 10 986,23 лв.

		протокол ✓ договор с фирмата изпълнител ✓ снимков материал	луминесцентни осветителни тела; доставка и монтаж на предпазни решетки на осветителни тела; ремонт на осев вентилатор; обезопасяване и ремонт на ел. инсталация; основен ремонт на ел. табло; ремонт на входна врата; почистване на стените от метални анкери, обрушване и изкърпване на мазилка и боя; боядисване на изкърпените места	
Район Искър	163 ОУ „Черноризец Храбър“ 367 ученици/ 17 паралелки	СО-2100- 711/13.09.2014 г. ✓ доклад-отчет ✓ фактури ✓ приемо- предавателен протокол ✓ копие от договор и анекс към договор с фирмата изпълнител ✓ снимков материал	Ремонт на тоалетни до физкультурен салон; три съблекални; коридори пред тоалетна и съблекални; изкърпване и боядисване на стени, поставяне на окачени тавани, подмяна на ел. и В и К инсталации, подова мазилка, поставяне на сифони, мивки, батерии, монтаж на вентилатор, подмяна на ел. ключове, контакти, осветителни тела, монтаж на алуминиеви врати и прегради.	Отпуснати целево 11 000 лв. Извършен ремонт на стойност 12 137,42 лв., като сумата от 1137,42лв. е за сметка на делег. бюджет на училището
Район Средец	12 СОУ „Цар Иван Асен II“ 618 ученика / 27 паралелки	СО-0800- 72/27/27.11.2014г. ✓ доклад-отчет ✓ фактури ✓ приемо- предавателен протокол ✓ копие от договор и анекс към договор с фирмата изпълнител ✓ снимков материал ✓ оферта ✓ КСС	Извършена е цялостна подмяна на електро трасето, поставени са нови осветителни тела и електрически табла. Укрепени и боядисани са решетките на радиаторите, поставени са нови баскетболни табла. Стените и тавана са изкърпени, шпакловани и боядисани.	Отпуснати целево 12 022 лв. Уسوени 12 022 лв.
Район Лозенец	107 ОУ „Хан Крум“ 641 ученика/ 27 паралелки	✓ КСС ✓ договор с фирмата изпълнител ✓ документ за отложено плащане ✓ платежно нареждане за авансово изплащане ✓ фактури	Направа на фундаменти за спортни аксесоари; поставяне на спортна, акрилна настилка върху гумена подложка; Ударо погъщаща настилка , плочи 40x40 см, дебелина 20 мм - при детска площадка; монтаж на оградна мрежа; поставяне на футболни врати с надстройка баскетболен кош; висилка/ успоредка за детска площадка	Отпуснати целево 12 000 лв. Уسوени 36 838,908 лв. /*ремонтът се дофинансира от УН на училището/

Общински спортни площадки


Районна администрация	Адрес на площадката	Вх. № / представени документи	Извършени ремонтни дейности	Преведени /Усвоени средства
Район Люлин	Люлин 2, до бл. 224	СО-9300-8/23/12.09.2014 г. доклад-отчет √ фактура √ приемопредавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ снимков материал	Изчукване мазилка по стена към тенис-корт; направа на топлоизолация по цокъл, полагане на епоксидна смола за пукнатини в бетон; доставка, монтаж и боядисване на решетки за ограда; доставка, монтаж, обтягане и боядисване на оградна мрежа с профили; ремонт и боядисване на пейки; ремонт на осветително тяло; изравнителна циментова замазка за северозападния край на корта; доставка и поставяне на мрежи за две футболни врати	Отпуснати целево 5 000 лв. Усвоени 4 919,40 лв.
Район Сердика	кв. „Банишора“, пред бл. 43	СО-9300-8/22/10.09.2014 г. доклад-отчет √ фактури √ приемопредавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ възлагателно писмо към договор √ снимков материал	Възстановяване на оградна мрежа /демонтаж, доставка и монтаж/; доставка и монтаж на мрежи за две футболни врати	Отпуснати целево 4 500 лв. Усвоени 4 488 лв.
Район Студентски	ж.к. „Младост 1“, между бл. 89, бл.90 и бл. 91	СО-9300-8/20/15.07.2014 г. √ доклад-отчет √ фактура √ приемопредавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ снимков материал	Изработка, доставка и монтаж на 12 оградни пана; ремонт и боядисване на 14 пана; ремонт и боядисване на две футболни врати; залеждане частично на настилка – изкуствена трева	Отпуснати целево 4 500 лв. Усвоени 4 500 лв.
Район Сердика	кв. „Банишора“, пред бл. 26 и блок 28	СО-0805-163/2/16.12.2014 г. доклад-отчет √ фактура √ приемопредавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ снимков материал √ КСС	Подменени са части от оградната мрежа и са поставени нови футболни врати.	Отпуснати целево 2 500 лв. Усвоени 2 491,20 лв.

Район Нови Искър	село Чепинци	доклад-отчет √ фактура приемо-предавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ КСС √ снимков материал	Доставка и монтаж на оградна мрежа, монтаж на нови входни врати, поставяне на мрежи на футболните врати, поставяне на парчета изкуствена трева, грундиране и боядисване.	Отпуснати целево 5 000 лв. Усвоени 4 995 лв.
Район Нови Искър	село Световрачане	СО-0821- 324/2/03.12.2014 г. √ доклад-отчет √ фактура √ приемо- предавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ снимков материал	Монтаж на нови оградни платна и укрепващи връзки между колоните; поставяне на мрежи на футболните врати, ремонт на входна врата.	Отпуснати целево 3 500 лв. Усвоени 3 500 лв.
Район Овча купел	жк „Овча купел 2“, бул. „Тинкълн“ – горна част	СО-0818-251/1/ 11.12.2014г. доклад-отчет √ фактура √ приемо- предавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ снимков материал √ КСС	Доставка и монтаж на нови баскетболни кошове и метална стойка, възстановяване на игрална маркировка, укрепване и възстановяване на съществуващи профили и обтегачи, монтаж на нова мрежа, почистване на площадката и премахване на разрушена коментаторска кабина, възстановяване на футболни врати	Отпуснати целево 5000 лв. Усвоени 4 977,07 лв.
Район Триадница	жк „Гоце Делчев“, зад бл. 101	СО-0810-233/2/ 23.12.2014г. √ доклад-отчет √ фактура √ приемо- предавателен протокол √ договор с фирмата изпълнител √ снимков материал √ Протокол обр.19	Доставка и поставяне на 15 нови оградни пана; допълнително укрепване на мрежата за вратите, поставяне на нова входна врата с метална рамка, две нови хандбални врати с мрежи; заваряване на разхлабени елементи	Отпуснати целево 6 000 лв. Усвоени 5 944,48 лв.


IV. Мониторинг - информираност и публичност

- проведени са работни срещи с директорите на включените в Програмата общински училища, както и обход на място на съответните физкултурни салони, училищни дворове и спортни площадки;
- изготвени са протоколи за наблюдение на включените в Програмата обекти;
- публикувана е информация за Програмата на страницата на дирекция ПИСТ и снимков материал на извършените ремонтни дейности.

Физкултурен салон 130 СОУ "Стефан Караджа"

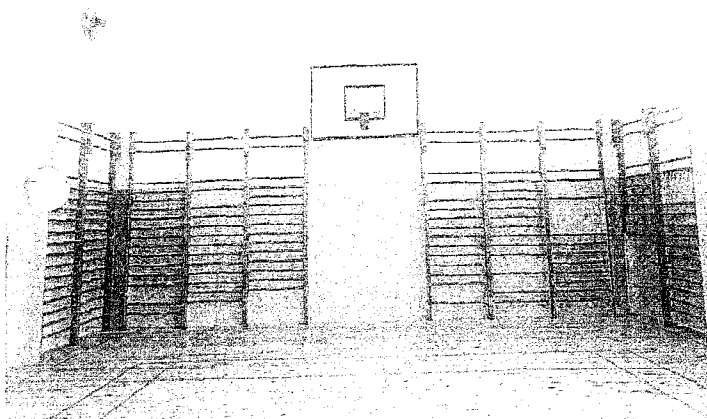






Физкултурен салон 10 СОУ "Траян Траянов"

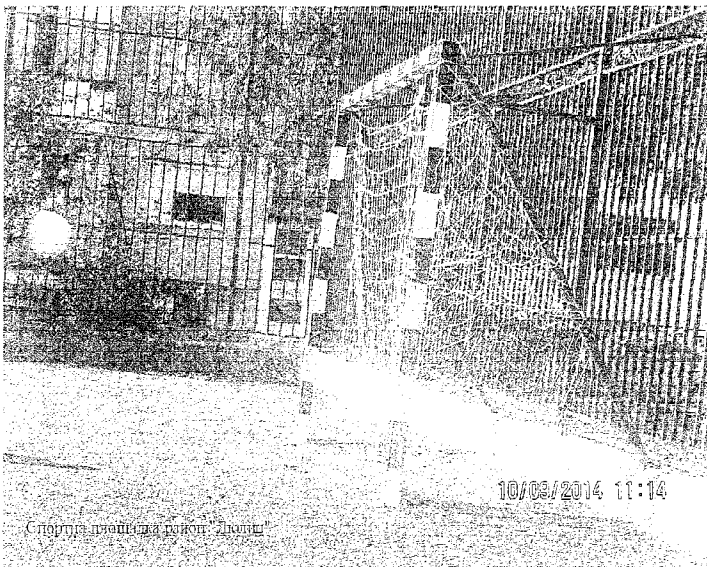

Спортна площадка д-р Коч. Дювев

Физкултурен салон 12 СОУ "Цар Иван Асен II"

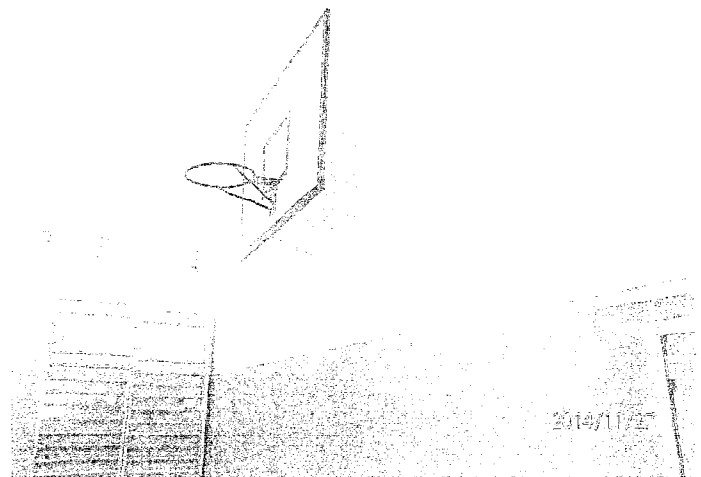

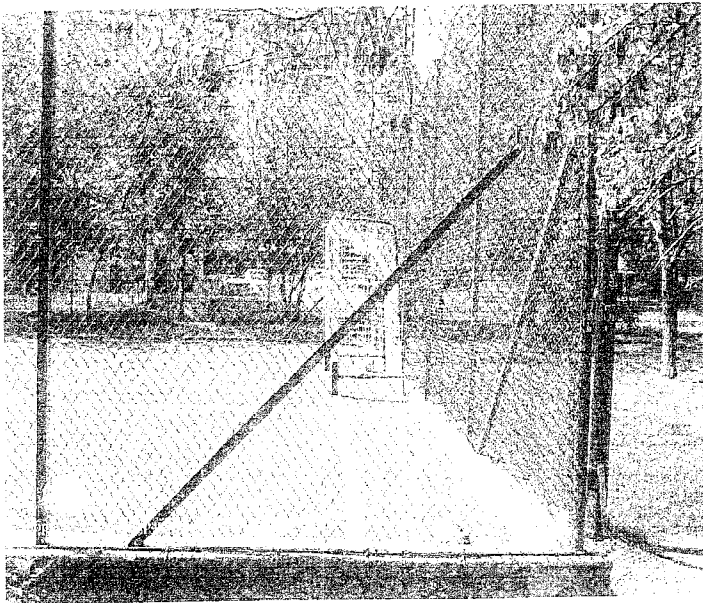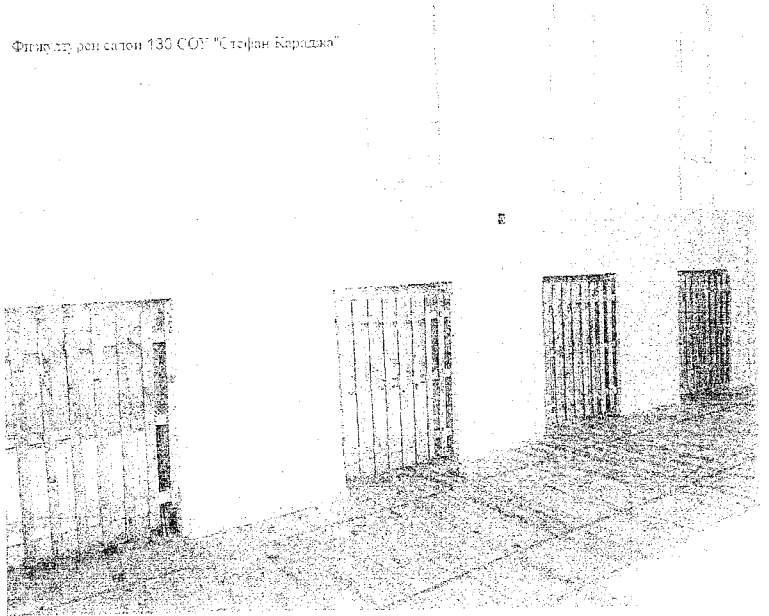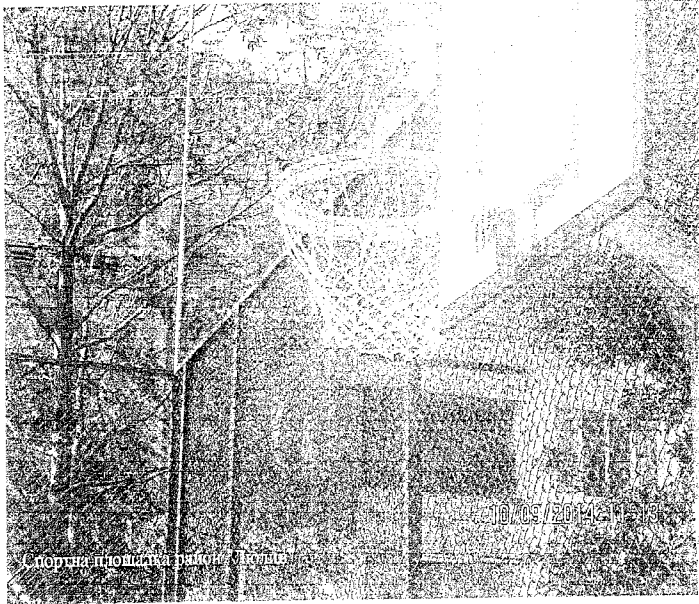

Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ

.....
ЗАМЕСТИНИК - КМЕТ НА СО
КООРДИНАТОР НА ПРОГРАМА ЗА ФВС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
