



Приложение I

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА - 2017 ГОДИНА

I. Административно обслужване

1. Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2017г. е утвърдена с Решение 150/06.04.2017г. на СОС в размер на 545 800 лева /като 200 000 лева от тях са *капиталови разходи*/. Одобрените за финансиране обекти са съгласувани с ПК ДМС, както следва:

- 5 училищни физкултурни салони - 100 000 лева;
- 4 училищни спортни площадки /училищни дворове/ - 63 000 лева;
- аварийни ремонти на спортни площадки – 25 800 лева;
- 12 парк фитнес площадки и 22 тенис маси – 357 000 лева.

2. С Решение 200/06.04.2017 година на СОС е коригиран бюджета на Програмата за ремонт с **20 000 лева**, по точка IV. *Парк фитнес площадки и тенис маси*.

3. С Решение 343/22.06.2017 година на СОС са направени промени и актуализирани адреси на обекти в Годишния план на Програмата за ремонт на спортна инфраструктура -2017 година:

- докладна записка № СОА17-ВК66-3622/30.05.2017 г. са одобрени за ремонт спортни площадки в 2 районни администрации – район „Студентски” – **19 155 лева** и район „Овча купел” – **5 000 лева**;
- докладна № СОА17-ВК66-2174/28/08.06.2017 година – относно промяна локации на включени в Програмата обекти.

4. С докладна записка № СОА17-ВК66-2174/35/24.07.2017 г. и положително становище от ПК ДМС - СОА17- ВК66-2174/40/13.09.2018 г. са пренасочени остатъчни средства, в размер на **2 360 лева**, от район „Лозенец” към 35 СУ „Добри Войников” – за закупуване на спортни пособия;
- писмо вх. № СОА17-ВК66-2174/34/11.07.2017 г. – информация, относно отпадане на един обект в район „Лозенец” и поставяне на три маси, вместо четири, съгласно Решение 150/06.04.2017г. на СОС, поради непредвидени разходи и недостиг на финансов ресурс.

5. С писмо № СОА17-ВК66- 2174/43/27.09.2017 г. е направена промяна локацията за поставяне на тенис маса в район „Изгрев”, съгласно Решение 150/06.04.2017г. на СОС, поради жалби на жители и невъзможност за достъп на техника до терена.

6. Във връзка с писмо № СОА17- ВК08-10419/08.08.2017 г., относно осигуряване на средства за ремонт на хижа „Боерица” и Решение № 694/26.10.2017 г. на СОС са преведи остатъчни средства по Програма за ремонт на спортна инфраструктура, в размер на **9 645 лева**, на район „Витоша”.

7. Във връзка с писмо № СОА17-ВК08-15470/17.11.2017 г. от район „Овча купел” и докладна № СОА17-НЦ62-1269/2/28.11.2017 г., поради изчерпани средства по Програма за ремонт, са пренасочени средства в размер на **3 256 лв.** от Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи, под патронажа на Кмета на Столична община - за аварийен ремонт на спортна площадка зад бл. 526, район „Овча купел”.


8. Във връзка с докладна записка СОА17-НЦ62-1269/2/28.11.2017 г. от заместник-кмет на СО и положително становище на ПК ДМС - СОА17-НЦ62-1269/3/07.12.2017 г. - е направена корекция на бюджета на район „Овча купел”, в размер на 1780 лева, за аварийен ремонт на баскетболна площадка в кв. Горна баня 70. Средствата са осигурени от бюджет на дирекция ПИСТ/ Годишен календарен план/ Ученически игри и не са включени в общата сума на Програмата за ремонт.

Решения на СОС /финансов анализ	Утвърдени средства
Решение 150/06.04.2017г. СОС за утвърждаване на Програмата за ремонт за 2017 г.	545 800 лв.
С Решение 200/06.04.2017 година бюджетът на Програмата за ремонт е увеличен с 20 000 лева, по точка IV. <i>Парк фитнес площадки и тенис маси</i>	20 000 лв.
Докладна № СОА17-НЦ62-1269/2/28.11.2017 година са пренасочени средства	3 256 лв.
ОБЩО осигурени средства:	569 056
Решение № 694/26.10.2017 г. са преведи остатъчни средства по Програма за ремонт на спортна инфраструктура, в размер на лева, на район „Витоша	9 645 лв.
ОБЩО разходени средства:	559 411 лв.

II. Обекти и извършени строително-монтажни и ремонтни дейности.

В Програмата са включени 44 обекта:

- 5 училищни физкултурни салони - 100 000 лева;
- 4 училищни спортни площадки /училищни дворове/- 63 000 лева;
- 12 парк фитнес площадки и 21 тенис маси – 369 000 лева;
- аварийни ремонти на 2 спортни площадки, въз основа на писма и искания от кметове на районни администрации, допълнително включени в Годишен план на Програма за ремонт на спортни инфраструктура – 27 411 лева;

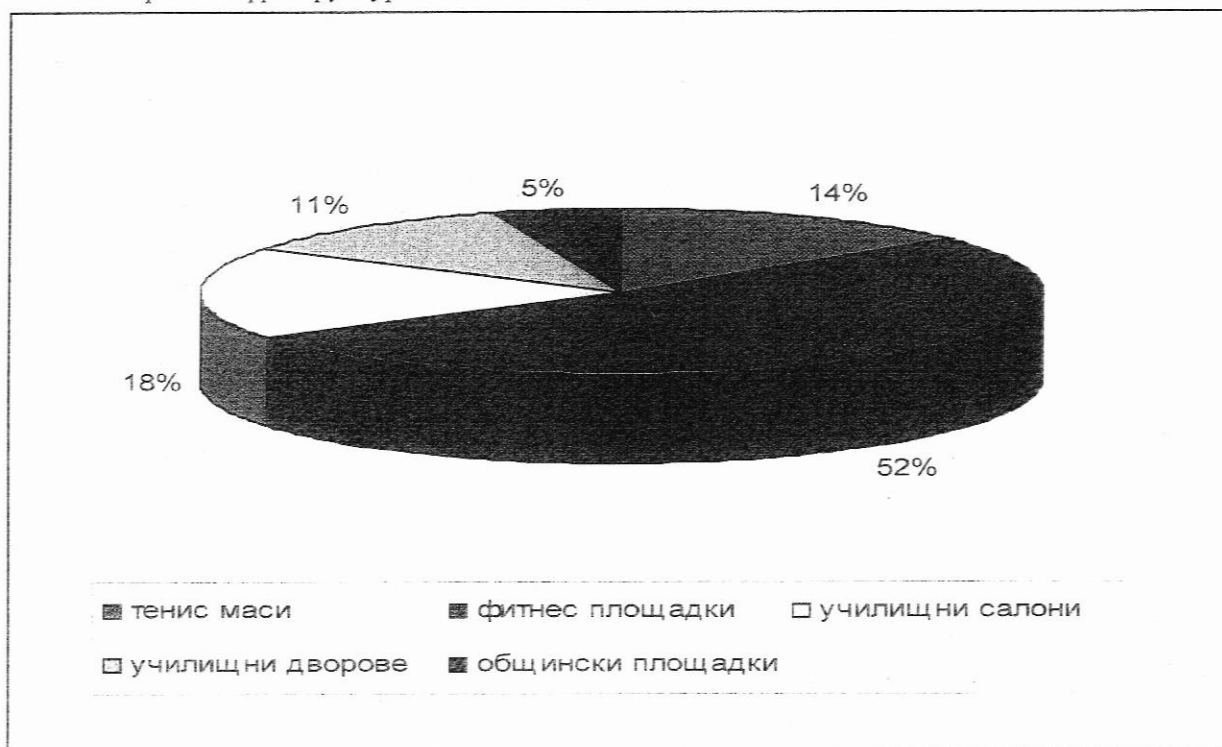

Общият бюджет на Програмата за ремонт на спортни инфраструктура за 2017 година е 559 411 лева, от които 200 000 лв. са капиталови разходи.

III. Обобщена информация - добри практики и препоръки

1. Добри практики:

- увеличаване бюджетът на Програмата за ремонт и броя на финансираните обекти;
- обхващане на 21 районни администрации.

2. Дефицити:

- късно и непълно отчитане от страна на районните администрации;
- липсата на определено лице от районната администрация за контакт и съгласуване;
- не съгласуване на настъпили промени в избора на обекти или размера на средствата със Столична община;
- налагане на повторно финансиране на един и същи обект.

РА	Училище	Вх. № на представени документи	Извършени ремонтни дейности	Осигурени/Отчетени средства
Панчарево	192 СУ „Христо Ботев“ с.Бистрица	Вх. № СОА16-ВК66-1083/55/ 02.06.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнителя КСС ✓	Ремонт на голям физк.салон – поставяне на нова винилова настилка, шпакловане и грундиране на стени, поставяне на нови уреди, нови осветителни тела и решетки, бойлерно тяло, изолация на кабели и връзки.	Осигурени: 29 000 лв. Отчетени: 28 955,72 лв. Остатък: 44,28 лв.

*изпълнение на Решение №206/17.03.2016 г. на СОС

1.Училищни физкультурни салони
- 5 обекта в 5 районни администрации – на обща стойност 100 000 лв.

РА	Училище	Вх. № на представени документи	Извършени ремонтни дейности	Осигурени/Отчетени средства
Искър	68 СУ „Академик Никола Обрешков“	Вх. № СОА17-ВК08-3698/2/ 26.06.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнителя КСС ✓	Ремонт на голям салон- монтаж на нови отоплителни тела, монтаж на предпазни решетки Малък салон - монтаж на нови отоплителни тела, монтаж на предпазни решетки, поставяне на нова двойна врата, ново осветително тяло, боядисване на решетки към нето, ново дюшеме- штайфане, футуриране и лакиране;монтаж на предпазна мрежа за прозорци; коридор към м.салон–ново отоплително и осветително тяло,шпакловане, грундиране и боядисване на стени	Осигурени: 25 000 лв. Отчетени: 24 942 лв Остатък: 58 лв.
Слатина	94 СУ „Димитър Стратимиров“	Вх. № СОА17-ВК66-2174/45/24.10.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Акт обр. 19 ✓ Снимков материал /преди-след/ обр. 19 ✓ Копие приемо-предавателен протокол Копие договор с фирма изпълнителя ✓ Протокол обр. 19 ✓	Шпакловка и боядисване на стени тавани, демонтаж на осветителни тела и монтаж на нови със предпазна решетка, почистване на мозайков под, монтаж на нови врати и освежаване на прилежащи хигиенни помещения.	Осигурени: 15 000 лв. Отчетени: 14 951,76 лв. Остатък: 48,24 лв.

Израев	105 СУ „Атанас Делчев”	Вх. № СОА17-БК66-2174/39/07.09.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Ремонт на голям физк.салон- шпакловка и боядисване на стени и таван, монтаж на осов вентилатор и осветителни тела Ремонт на малък физк. салон – демонтаж на ламиниран паркет, изравнителна замазка за под, монтаж на PVC первази, шпакловка и боядисване на стени и таван, направа на гипсова шпакловка Ремонт на съблекални на втори етаж – направа на гипсова мазилка по таван, грундиране и боядисване на таван.	Осигурен 25 000 лв. Отчетени: 24 962,28 лв. Остатък: 37,72 лв.	
Панчарево	192 СУ „Хр. Ботев”	Вх. № СОА17-У321-1622/09.11.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Сметка-опис ✓	Ремонт на футболно игрище в училищен двор – извършени поставяне на тревна настилка, монтаж на футболни врати, монтаж на бетонови решетъчни елементи.	Осигурен 25 000 лв. Отчетени: 24 987,09 лв. Остатък: 12,91 лв.	
Младост	82 ОУ „Васил Априлов”	Вх. № СОА17-БК66-2174/52/15.12.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Протокол обр. 19 ✓ КСС ✓	Ремонт на съблекални и коридор към физкултурен салон – шпакловане и боядисване на стени, подмяна на входна врата, направа на ел. връзки, хидроизолация под покрив на коридор, монтаж на ПВЦ прозорци над съблекални, обзавеждане на съблекални.	Осигурен 10 000 лв. Отчетени: 10 709,14 лв. /709,14 лв. съфинансиране от страна на училището/ Остатък: 0 лв.	

II. Училищни спортни площадки

- 4 обекта в 3 районни администрации на обща стойност 63 000 лв.

РА	Училище	Вх. № на представени документи	Извършени ремонтни дейности	Осигурени / Отчетени средства	
Сердика	100 ОУ „Найден Геров”	Вх. № СОА17-БК66-2174/38/29.08.2017г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Монтаж на външни спортни съоръжения – 2 бр. баскетболни коша и разчертаване на баскетболно игрище, 2 бр. футболни врати и разчертаване на футболно игрище, спортно съоръжение „успоредка”, „ръкоход” и лост за набране на гри	Осигурени 13 000 лв. Отчетени: 12 982,80 лв. Остатък:	

		Възлагателно писмо ✓ Сметка за изпълнение на СМР ✓ Акт. обр. 19 ✓	лива".	17,2 лв.	
Връбница	140 СУ „Иван Боторов”	Вх. № СОА17-БК66-2174/54/04.01.2018 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Акт. обр. 19 ✓	Ремонт на изкуствено футболно игрище при 140 СУ „Иван Боторов” – извършена е подмяна на изкуствената тревна настилка,	Осигурени 20 000 лв. Отчетени 19 998,60 лв. Остатък: 1,40 лв.	
	172 ОУ „Христо Ботев”, кв. Гниляне	Вх. № СОА17-БК66-2174/46/31.10.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Протокол АКТ обр. 19 ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Пресфалтиране на участъци от асфалтова настилка на открито спортно игрище	Осигурени 10 000 лв. Отчетени 9949,20 лв. Остатък: 50,8 лв.	
Нови Искър	177 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, Сметоварчане	Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Акт. обр. 19 ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Анекс №1 към Договор ✓	Ремонт на мултифункционална спортна площадка – подмяна на отградна мрежа, осветление и възстановяване на тревна настилка.	Осигурени 20 000 лв. Отчетени 44 410,97 лв. * Осигурено допълнително финансиране със Заповед № 357/31.5.017г. на Кмет на СО Остатък: лв.	

III. Аварийни ремонти

2 обекта в 2 районни администрации на обща стойност 27 411 лв.

РА	Училище	Вх. № на представени документи	Извършени ремонтни дейности	Осигурени Отчетени средства	Осигурени/Отчетени
Овча купел	кв. Овча купел 1, зад бп. 526 спортна	СОА18-БК08-971/19.01.2018 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ СМР ✓	Извършен аварийен ремонт на спортна площадка-укрепване на силно наклонени, ръждавали метални пана, поставяне на нови метални пана и поставяне на нови метални колове.	Осигурени 5 000 лв. Отчетени: 5 000 лв.	

площадка	Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнителя ✓ Акт. Обр. 19 ✓ ККС ✓	Почистване на площадката, премахване на дърветата, корени и храсти, направа на изкоп и замоналитване на закладна част, укрепване на отградата, поставяне на нови отградни пана, боядисване на отградата	Оценурен и 3 256 лв. Очетен 3 255,24 в. Остатък 0,76 лв.
	Разходо-оправдателни документи ✓ Акт. Обр. 19 ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнителя ✓	Девришен ремонт на баскетболна площадка – демонтажите на съвременни баскетболни кошове и стойки, направа на изкоп, поставяне на фундаменти и поставяне на нов кош и табло.	Оценурен и 1 780 лв. от бюджета на дирекция ПНС "Т" Очетен 1 779,83 лв. Остатък 0,17 лв.
Студентски	вх. № СОА17-ВК08-5518/4/31.10.17 г. Разходо-оправдателни документи /фактури/ ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Акт. Обр. 19 ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнителя ✓	Частичен ремонт на спортна площадка – монтаж на нови отградни пана, на допълнителна предпазна мрежа, укрепване на футболни врати, възстановяване и подмяна на участъци от изкуствена тревна настилка.	Оценурен и 19 155 лв. Очетен 18 641,4 лв. Остатък 513,60 лв.
IV. Парк фитнес площадки и тенис маси			
12 парк фитнес конструкции и 21 тенис маси в 18 районни администрации /*35 СУ „Добри Войков“ - МТД/			
РА	Училище	Вх. № на представени документи	Извършени ремонтни дейности
Овча купел	кв. Горна Бана, ул. „Николай Хрелков“ – 70 кв.	Вх. № СОА18-ВК08-971/19.01.2018г. Разходо-оправдателни документи Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнителя ✓ Протокол Обр. 19 ✓ Разрешение за строеж ✓	Строително-монтажни дейности по изграждане и поставяне на парк фитнес площадка лостова система. Оценурен и 37 000 лв. Очетен 36 996,6 лв. Остатък 3,35 лв.

Възразяване	жк.Сердика, м/у бл.18 и 18А	Вх. № СОА17-ВК66-2174/44/10.10.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ КСС ✓ Протокол Обр. 19 ✓	Монтирана комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за стрийт фитнес. Демонтаж на стара и монтаж на нова тенис маса.	Осигуряване 21 000 лв. Отчетен 20 975 лв. Остатък: 25 лв.
	Парк „Св. Никола“, зона Б4			
Панчарево	с.Лозен, ул. „Янко Панайотов“ и ул. „Горник“	Вх. № СОА17-ВК66-2174/47/31.10.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Констативен протокол – 2 бр. ✓ Протокол за откриване на стр.пл. ✓	Строително-монтажни дейности по изграждане и поставяне на комбинирана парк фитнес площадка – лостова система, мултифункционални фитнес уреди, кростренажор-кардиофитнес уред, върху настилка дървесни кори /мулч/.	Осигуряване 20 000 лв. Отчетен 19 999,94 лв. Остатък: 0,06 лв.
Искър	жк. Дружба 1, кв.26	Вх. № СОА17-ВК08-3698/4/19.10.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Заповед № РИС17-РД15-1127/2017 Ценова оферта ✓ Сертификати за кач. на уредите - 4 бр. ✓	Строително-монтажни дейности по изграждане и поставяне на комбинирана парк фитнес площадка – лостова система и три тренажора, върху каучукова настилка.	Осигуряване 30 000 лв. Отчетен 29 992,03 лв. Остатък: 7,97 лв.
Илинден	Междублоково пространство – бл. 337, 350, 350а и 349	Вх. № СОА17-ВК08-2174/51/18.12.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Ценово предложение ✓ Разрешение за строеж ✓ Декларация за съответствие ✓	Строително-монтажни дейности по изграждане и поставяне на парк фитнес площадка лостова система.	Осигуряване 24 000 лв. Отчетен 23 996,28 лв. Остатък: 3,72 лв.

Нови Невър	Парк фитнес площадки в с. Подумер и с. „Войнеговици“ и тенис маса в кв. Курило	вх. № СОА17-ВК66-2174/46/31.10.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Ценово предложение ✓ Заповед за изготвяне на технически документи ✓ Констатилен АКТ обр. 15 – 2 бр. ✓ АКТ Обр. 19 ✓	Изграждане на две комбинирани пак фитнес площадки и поставяне на тенис маса до изградена през 2016г. площадка.	Оценурен 55 000 лв. Отчетен 54 641,88 лв. Остатък: 358,12 лв.
	жк. Люлин, 9 м.р., пред бл. 959	вх. № СОА17-ВК08-1881/16.11.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ АКТ Обр. 19 ✓	Строително-монтажни дейности по изграждане и поставяне на парк фитнес площадка лостова система.	Оценурен 30 000 лв. Отчетен 29 997,71 лв. Остатък: 2,10 лв.
Кремиковци	кв. Враждубна, ул. № 7	вх. № СОА17-ВК08-1331/55/14.12.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ Ценова оферта и КСС ✓ АКТ Обр. 19 ✓	Строително-монтажни дейности по изграждане и поставяне на парк фитнес площадка лостова система.	Оценурен 25 000 лв. Отчетен 24 993,91 лв. Остатък: 6,10 лв.
Люлеци	ул. „Майор Томска“ и ул. „Драгалевска“	вх. № СОА17-ВК66-2174/34/11.7.2017 г. вх. № СОА17-ВК66-2174/53/21.12.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Поставени 3 бетонови тенис маси с мозаечно покриве.	Оценурен 12 500 лв. Отчетен 12 500 лв. Остатък: 0 лв.
	ул. „Добър юнак“ и ул. „Розова долина“			
	Лесопарк „Копарите“, в частта м/у бул. „Черни връх“ и „Елин връх“			

Надежда	35 СУ „Добри Войников” – допълнително включен	вх. № СОА17-ВК08-12126/14.09.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓ АКТ № 2997 ПОС ✓ Протокол Обр. 19	С писмо СОА17-ВК66-2174/41/20.09.2017 остатъчната сума от 2360 лева е насочена към 35 СУ „Добри Войников”. Закупена е биталца пътека и консумативи за нея. Изградена парк фитнес площадка, тип лостова система с каучукова настилка.	Осигурен 1 25 000 лв. Очтени: 25 000 лв Остатък: 0 лв.
	жк. „Лев Толстой”, източна страна на бл. 65	вх. № СОА17-ВК08-16432/2/22.01.18 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Оферта за изграждане на парк фитнес площадка ✓	Изградена парк фитнес площадка с настилка от дървесни кори и поставена една тенис маса.	Осигурен 1 20 000 лв. Очтени: 20 000 лв Остатък: 0 лв.
Банкя	с. Иваняне	вх. № СОА17-ВК66-2174/33/6.07.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓	Комбинирана мултифункционална лостова конструкция за стрийт фитнес с ударопоглътяща настилка от дървени кори /мулч/	Осигурен 1 23 000 лв. Очтени: 22 996,52 лв. Остатък: 3,48 лв.
	жк. Халжи Димитър, пред 24 СИ „П. Яворов” кв. Левски, ул. „Поп Г руйо” и ул. „Хан Кардам”	вх. № СОА17-ВК66-2174/48/6.11.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Поставена 1 бетонова тенис маса с мозаечно покритие.	Осигурен 1 7 500 лв. Очтени: 7 500 лв. Остатък: -0 лв.
Студентски	Парк „Студентски”	вх. № СОА17-ВК66-2174/38/29.08.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Монтаж на две бетонови тенис маси върху асфалтова основа	Осигурен 1 12 000 лв. Очтени: 12 000 лв Остатък: 0 лв.
Сердика	жк. „Фондови жилищна между блок 206 и блок 207	вх. № СОА17-ВК66-2174/38/29.08.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Демонтирани са три стари тенис маси и са поставени нови с плотове от шлайфана мозайка. Доставка и монтаж на една метална тенис маса.	Осигурен 1 12 000 лв. Очтени: 12 000 лв Остатък: 0 лв.
	жк. „Ванишора” блок 43	вх. № СОА17-ВК66-2174/38/29.08.2017 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /преди-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Демонтирани са три стари тенис маси и са поставени нови с плотове от шлайфана мозайка. Доставка и монтаж на една метална тенис маса.	Осигурен 1 12 000 лв. Очтени: 12 000 лв Остатък: 0 лв.

	кв. „Банишора“ между блок 38 и блок 38А	Сметка за изпълнение на СМР ✓	Поставена една тенис маса с бетонова основа и мозаечно покритие.	Осигурени 3 500 лв. Отчетен 3 499,8 лв. Остатък: 0,20 лв.	
	кв. „Банишора“ блок 69				
Оборител	бул. „Мадрид“, ул. „Черковна“ и ул. „Пресансе“	Вх. № СОА17-ВК66-2174/49/5.12.2017г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓			
Красна поляна	жк. Красна поляна III, бл. 332 и бл. 333	Разходо-оправдателни документи Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Поставени 2 бетонови тенис маси с мозаечно покритие	Осигурени 10 000 лв. Отчетен 9 996 лв. Остатък: 4 лв.	
	жк. Западен парк, бл. 108 и бл. 109	Копие Протокол Образец №19 ✓ Документи по процедура по ЗОП ✓			
	жк. Разсадник- Каньовица, бл. 20 и бл. 20а		Поставена една тенис маса с метална конструкция и плоскост НЕХА		
Изгрев	жк. Дианабад, ул. „Константин Попрусов“ зад блок 20	Вх. № СОА17-ВК66-2174/39/07.09.17 г. Вх. № СОА17-ВК66-2174/43/29.00.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнител ✓	Поставени две бетонови тенис маси с плотове от шлайфана мозайка.	Осигурени 7 000 лв. Отчетен: 6 999,60 лв. Остатък: 0,40 лв.	
	жк. „Изток“ ул. „Академик Методи Попов“, пред бл. 48				
Триадина	жк. Сребище, зад бл. 26	Вх. № СОА17-ВК66-1331/56/21.12.17 г. Разходо-оправдателни документи ✓ Снимков	Поставени две бетонови тенис маси с плотове от шлайфана мозайка.	Осигурени 6 500 лв.	


жк. Стребище, ул. „Мидия“ и ул. „Йордан Йовков“	материал /пред-след/ ✓ Копие приемо-предавателен протокол ✓ Копие договор с фирма изпълнителя ✓ Декларация за съответствие ✓	Очетен 6 500 лв. Остатък: 0 лв.
---	---	--

.....
 Д-р ТОДОР ЧОБАНОВ
 Заместник – кмет на Столична община
 Координатор на Програма за разкритие на фискална




И. Димитров

Информативност и прозрачност







Район „Искър“ - 68 СУ

68 СУ, РА Искър

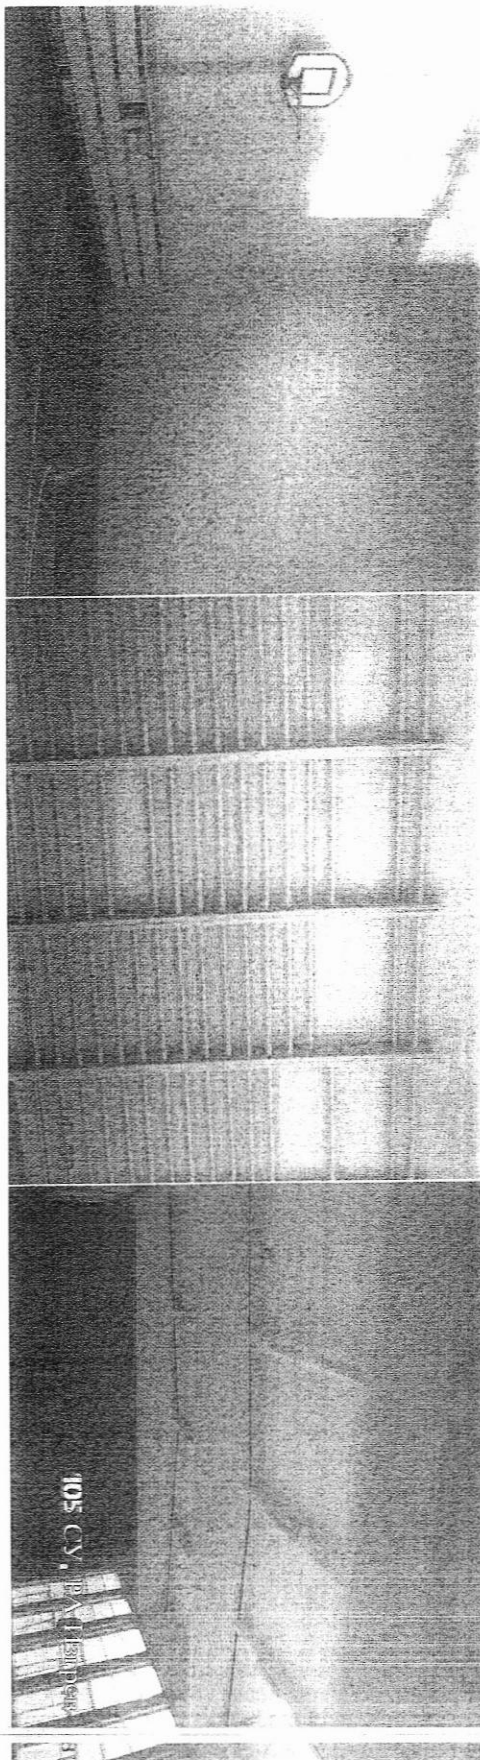

Район „Искър“

105 СУ, РА Искър

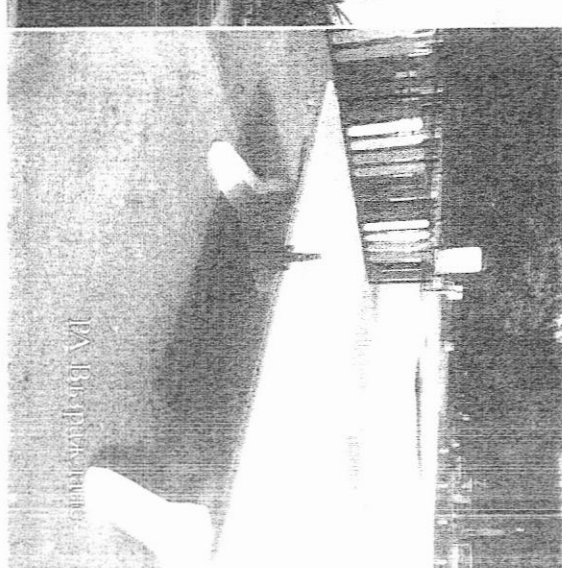





Район „Възраждане“

Район „Любич“

Район „Подгорица“

Район „Бистрица“

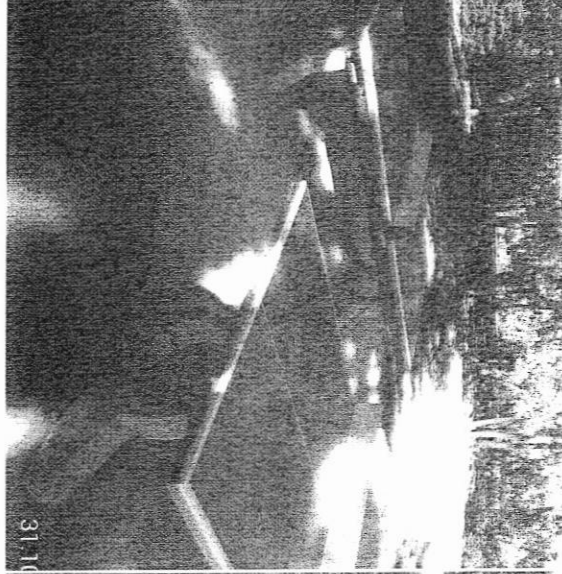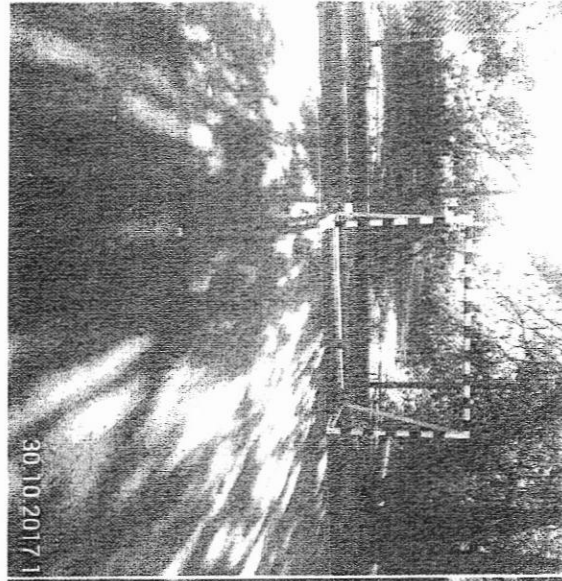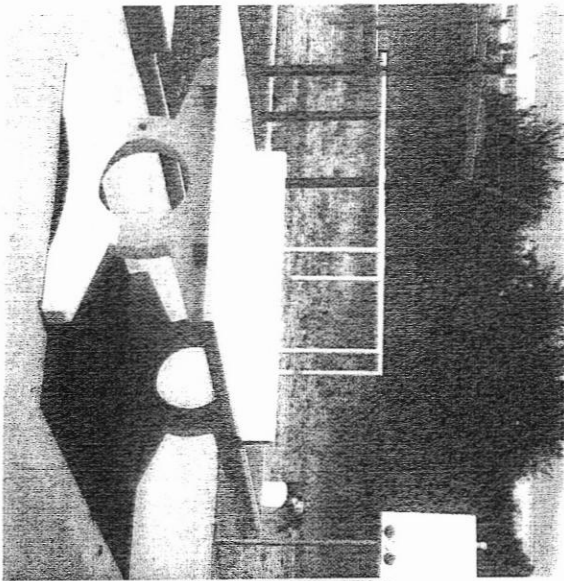

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
